Abgabe KW 11

Aufgabenblatt 1

Team: Ni0

Paul Berndt

Konstantin Fastovski

Elias Kerlin

Silas Rißler

Felix Weglehner

Projektzielsetzung 3
Risikoanalyse 4
Unklarer Umfang 4
Unklare / Ungleichmäßige Aufgabenverteilung 4
Feature Creep 4
Verzug / Überlastung bei Ausfall / Krankheit 5
Arbeiten mit unbekannten Technologien 5
Technische Unsauberkeit durch Zeitdruck 5
Scalability 6
Statusbericht KW11 7
Projektplan 8

Projektzielsetzung

Das Ziel des Projekts ist eine vollständig implementierte Webanwendung, die den Anforderungen des Kunden entspricht. Diese Webanwendung soll die Kernfunktionen implementieren und die Möglichkeit bieten, in Zukunft vom Kunden ausgebaut und erweitert zu werden.

Zentral für die Webapplikation ist die Möglichkeit, persönliche Aufgaben zu verwalten und mithilfe eines Algorithmus eine optimale Aufgabenverteilung durchzuführen. Dadurch sollen die Endbenutzer vor Überlastung geschützt werden und ihre Zeit produktiver nutzen können. Diese Optimierung erfolgt beispielsweise durch die Setzung von Prioritäten, die Verteilung von Lasten über längere Zeiträume sowie das Einplanen von Pausen. Die genaueren Kernfunktionen werden anhand der Kundenanforderungen sowie durch eine Recherche erarbeitet, mit dem Kunden abgestimmt und anschließend implementiert.

Das Projekt dient zusätzlich dazu, Kenntnisse aus den Vorlesungen praktisch anzuwenden. Hier sollen Erkenntnisse aus den Vorlesungen umgesetzt und ein Software-Engineering-Projekt von Anfang bis Ende durchgeführt werden.

Risikoanalyse

Unklarer Umfang

Wenn der Umfang des Projekts nicht vollständig klar ist, kann dies zu verschiedenen Folgeproblemen führen. Unter anderem kann es die Zeitplanung für das Projekt erschweren oder ein Missverständnis mit dem Kunden auslösen. Dadurch kann es vorkommen, dass das Endprodukt nicht den Kundenwünschen entspricht.

Um so etwas zu vermeiden, muss die Recherchephase sauber durchgeführt werden und im Projekt aufkommende Fragen zeitnah und ausführlich mit dem Kunden besprochen und festgehalten werden.

Unklare / Ungleichmäßige Aufgabenverteilung

Ein weiteres Risiko ist eine unklare Aufgabenverteilung. Wenn Aufgaben keiner zugewiesenen Person haben, besteht die Möglichkeit, dass sie vom Radar verschwinden und nicht erledigt werden oder am Ende immer beim Verantwortlichen des Bereichs hängen bleiben. Dieses „Hängenbleiben“ ist per se nicht schlimm, da der Verantwortliche offensichtlich die Verantwortung trägt. Dennoch hat es die weitere Folge, dass dadurch verschiedene Teammitglieder ungleichmäßig belastet werden.

Um das Risiko zu minimieren, muss eine relativ detaillierte Projektplanung durchgeführt werden. Jeder Aufgabe muss ein Mitarbeiter zugeordnet werden. Dabei kann ein Verantwortlicher Aufgaben delegieren, und Überlastungen können entweder von der Projektleitung erkannt oder vom betroffenen Mitarbeiter gemeldet werden, um die Aufgabenverteilung wieder anzupassen.

Feature Creep

Wenn der Umfang des Projekts nicht vollständig klar ist, kann dies zu verschiedenen Folgeproblemen führen. Unter anderem kann es die Zeitplanung für das Projekt erschweren oder ein Missverständnis mit dem Kunden auslösen. Dadurch kann es vorkommen, dass das Endprodukt nicht den Kundenwünschen entspricht.

Um so etwas zu vermeiden, muss die Recherchephase sauber durchgeführt werden und im Projekt aufkommende Fragen zeitnah und ausführlich mit dem Kunden besprochen und festgehalten werden.

Verzug / Überlastung bei Ausfall / Krankheit

Wenn der Umfang des Projekts nicht vollständig klar ist, kann dies zu verschiedenen Folgeproblemen führen. Unter anderem kann es die Zeitplanung für das Projekt erschweren oder ein Missverständnis mit dem Kunden auslösen. Dadurch kann es vorkommen, dass das Endprodukt nicht den Kundenwünschen entspricht.

Um so etwas zu vermeiden, muss die Recherchephase sauber durchgeführt werden und im Projekt aufkommende Fragen zeitnah und ausführlich mit dem Kunden besprochen und festgehalten werden.

Arbeiten mit unbekannten Technologien

Wenn der Umfang des Projekts nicht vollständig klar ist, kann dies zu verschiedenen Folgeproblemen führen. Unter anderem kann es die Zeitplanung für das Projekt erschweren oder ein Missverständnis mit dem Kunden auslösen. Dadurch kann es vorkommen, dass das Endprodukt nicht den Kundenwünschen entspricht.

Um so etwas zu vermeiden, muss die Recherchephase sauber durchgeführt werden und im Projekt aufkommende Fragen zeitnah und ausführlich mit dem Kunden besprochen und festgehalten werden.

Technische Unsauberkeit durch Zeitdruck

Wenn der Umfang des Projekts nicht vollständig klar ist, kann dies zu verschiedenen Folgeproblemen führen. Unter anderem kann es die Zeitplanung für das Projekt erschweren oder ein Missverständnis mit dem Kunden auslösen. Dadurch kann es vorkommen, dass das Endprodukt nicht den Kundenwünschen entspricht.

Um so etwas zu vermeiden, muss die Recherchephase sauber durchgeführt werden und im Projekt aufkommende Fragen zeitnah und ausführlich mit dem Kunden besprochen und festgehalten werden.

Scalability

Ein weiteres Risiko ist die Frage der Skalierbarkeit. Wenn die Architektur nicht bereits im Vorhinein sauber geplant ist, kann es später zu Problemen kommen, das Produkt auf mehr Kunden auszurollen.

Um dies zu vermeiden, muss die Architektur bereits in der Modellierungsphase zukunftsfähig geplant werden. Hier ist vor allem wichtig, die Architektur so zu wählen, dass sie problemlos erweitert werden kann.

Statusbericht KW11

In dieser Woche wurden primär organisatorische Tätigkeiten durchgeführt. Dazu zählte ein Kick-off-Meeting zum Festlegen der Rollen, zur groben Aufgabenverteilung sowie weitere organisatorische Abstimmungen. Zusätzlich fand am Ende der Woche ein Review-Meeting statt, in dem die durchgeführten Tätigkeiten besprochen und das weitere Vorgehen für die kommende Woche abgestimmt wurde.

Weiterhin wurden in dieser Woche technische Rahmentätigkeiten vorgenommen. Dazu gehörten das Festlegen eines Technologie-Stacks, das Aufsetzen von Repositories, der Projektplanungsoberfläche sowie eines Dokumentenspeichers in OneDrive. Der Technologie-Stack wird – entgegen der zuvor festgehaltenen Planung – nicht Go beinhalten, sondern auf Spring Boot basieren. Diese Änderung wird im kommenden Termin mit der Betreuung kommuniziert.

Darüber hinaus wurde die Teamwebseite initial erstellt und veröffentlicht sowie eine Risikoanalyse durchgeführt. Der Projektplan wurde ebenfalls initial befüllt. Im Laufe des Projekts wird dieser aufgrund sich verändernder Anforderungen sowie durch entsprechendes Feedback weiter verbessert und verfeinert, da er aktuell lediglich eine erste organisatorische Grundlage darstellt und noch deutliche Überarbeitung benötigt.

Für die kommende Woche ist primär Recherche geplant. Zusätzlich werden bereits Tätigkeiten begonnen, die keine direkte Abhängigkeit von dieser Recherche haben. Dazu zählen die Vorbereitung der Qualitätssicherung durch die Definition von Coding-Standards sowie erste Überlegungen zur Testumgebung.

Projektplan

Die Projektplanung wird zusammen mit der Kapazitätsplanung, Terminplanung sowie weiteren Bausteinen in ClickUp umgesetzt. Der aktuelle Stand des Projektplans ist angehängt.

Dabei ist zu beachten, dass weiter in der Zukunft liegende Bausteine noch keine genaue Zeitplanung enthalten, da ihr Umfang zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht zuverlässig abgeschätzt werden kann.

Unten abgebildet: Ausschnitt aus der Zeitplanung und der Kapazitätsplanung

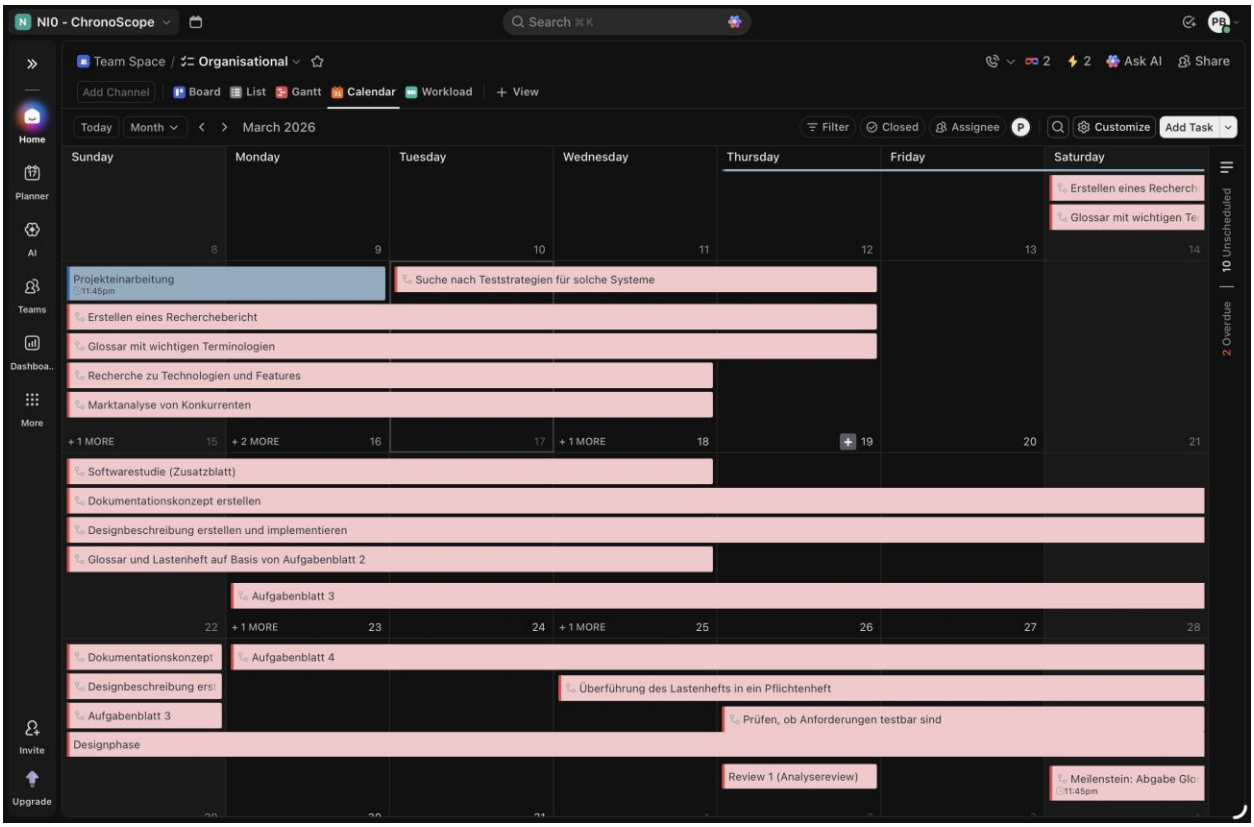
NI0 - ChronoScope
Search ⌘K
Team Space / Organisational
Ask AI
Share
Add Channel
Board
List
Gantt
Calendar
Workload
View
Today
Month
March 2026
Filter
Closed
Assignee
Customize
Add Task
Home
Planner
AI
Teams
Dashboa..
More
Invite
Upgrade
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Erstellen eines Recherch
Glossar mit wichtigen Te
10 Unscheduled
2 Overdue
Projekteinarbeitung
11:45pm
Suche nach Teststrategien für solche Systeme
Erstellen eines Rechercherbericht
Glossar mit wichtigen Terminologien
Recherche zu Technologien und Features
Marktanalyse von Konkurrenten
+ 1 MORE
+ 2 MORE
+ 1 MORE
Softwarestudie (Zusatzblatt)
Dokumentationskonzept erstellen
Designbeschreibung erstellen und implementieren
Glossar und Lastenheft auf Basis von Aufgabenblatt 2
Aufgabenblatt 3
+ 1 MORE
+ 1 MORE
Dokumentationskonzept
Aufgabenblatt 4
Designbeschreibung ers
Überführung des Lastenhefts in ein Pflichtenheft
Aufgabenblatt 3
Prüfen, ob Anforderungen testbar sind
Designphase
Review 1 (Analysereview)
Meilenstein: Abgabe Glo
11:45pm

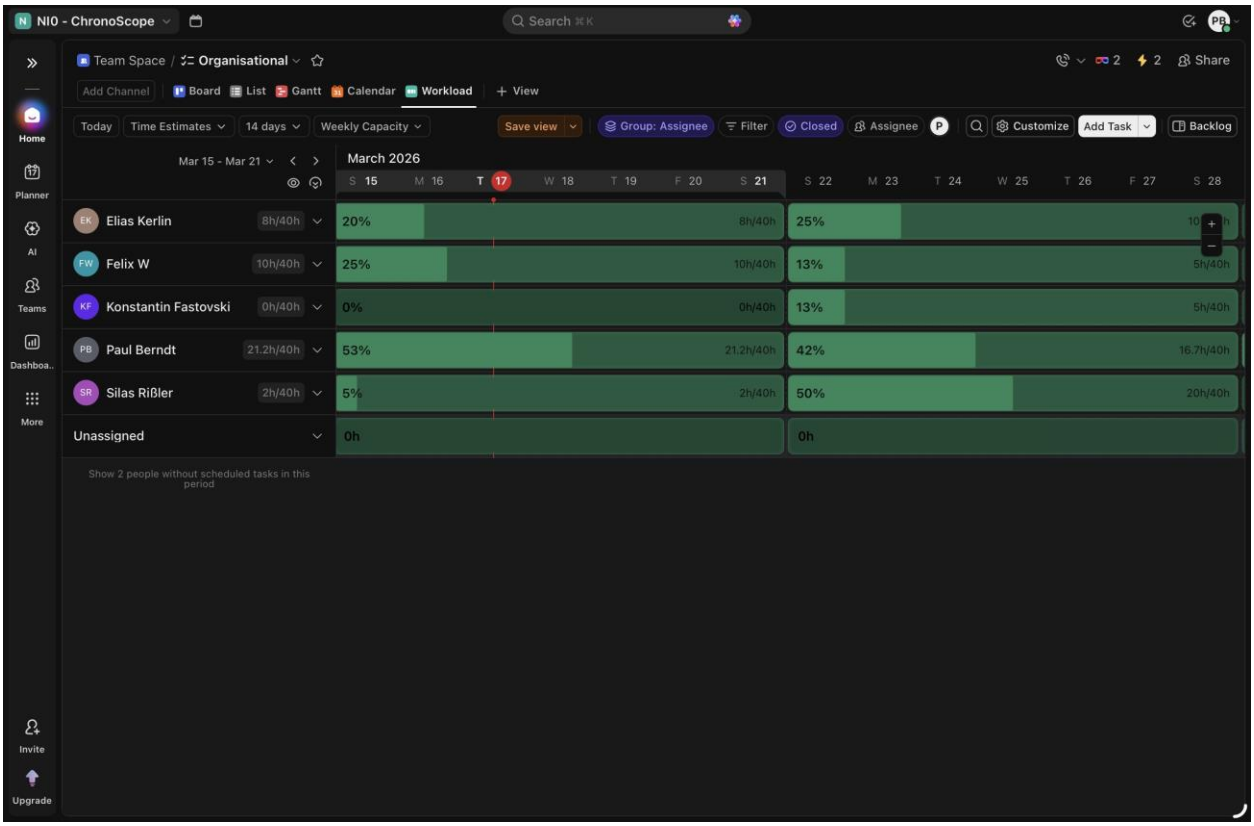
NI0 - ChronoScope
Search ⌘K
Team Space / Organisational
Share
Add Channel
Board
List
Gantt
Calendar
Workload
View
Today
Time Estimates
14 days
Weekly Capacity
Save view
Group: Assignee
Filter
Closed
Assignee
Customize
Add Task
Backlog
Mar 15 - Mar 21
March 2026
S 15
M 16
T 17
W 18
T 19
F 20
S 21
S 22
M 23
T 24
W 25
T 26
F 27
S 28
Home
Planner
AI
Teams
Dashboa..
More
Invite
Upgrade
Elias Kerlin
8h/40h
20%
8h/40h
25%
Felix W
10h/40h
25%
10h/40h
13%
5h/40h
Konstantin Fastovski
0h/40h
0%
0h/40h
13%
5h/40h
Paul Berndt
21.2h/40h
53%
21.2h/40h
42%
16.7h/40h
Silas Rißler
2h/40h
5%
2h/40h
50%
20h/40h
Unassigned
0h
0h
Show 2 people without scheduled tasks in this period
